



*Il Chief Corporate Affairs*

# Linee d'indirizzo per lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti nell'ambito del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (MOST)

Tipologia documento:  
Linee Guida e Procedura

ID: n° 63\_v.01

Ambito di applicazione:  
Gruppo

Processo:  
Studi strategici

Data: 19/03/2024

---

**INDICE**

|                                                                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PREMESSA .....                                                                                                                                  | 5  |
| IL GRUPPO FS ITALIANE NEL MOST .....                                                                                                            | 6  |
| SINTESI DEL PROCESSO .....                                                                                                                      | 8  |
| IDENTIFICAZIONE E PIANIFICAZIONE DEI PROGETTI .....                                                                                             | 9  |
| SVILUPPO DEI PROGETTI .....                                                                                                                     | 10 |
| RENDICONTAZIONE .....                                                                                                                           | 11 |
| Predisposizione della documentazione .....                                                                                                      | 14 |
| Invio documentazione e inserimento nel SIMS .....                                                                                               | 14 |
| Inserimento in “At Work” .....                                                                                                                  | 14 |
| Approvazione .....                                                                                                                              | 14 |
| Erogazione finanziamento .....                                                                                                                  | 15 |
| ALLEGATO 1 – Obblighi e modalità operative di rendicontazione amministrativo-contabile inerenti alla predisposizione della documentazione ..... | 26 |
| 1.1 Obblighi generali .....                                                                                                                     | 26 |
| 1.2 Spese del personale dipendente .....                                                                                                        | 29 |
| 1.3 Spese di consulenza specialistica .....                                                                                                     | 30 |
| 1.4 Spese di acquisto materiali, strumenti, attrezzature .....                                                                                  | 32 |
| 1.5 Altre tipologie di spese .....                                                                                                              | 34 |
| ALLEGATO 2 – Modulistica .....                                                                                                                  | 35 |
| ALLEGATO 2.1 Scheda Progetto .....                                                                                                              | 36 |
| ALLEGATO 2.2 Scheda Avanzamento Attività FS – MOST .....                                                                                        | 38 |
| ALLEGATO 2.3 Lettera d’incarico .....                                                                                                           | 39 |
| ALLEGATO 2.4 Timesheet .....                                                                                                                    | 40 |
| ALLEGATO 2.5 DSAN Attestazione ore svolte .....                                                                                                 | 41 |
| ALLEGATO 2.6 DSAN Autocontrollo attestazione verifiche svolte .....                                                                             | 42 |
| ALLEGATO 2.7 DSAN firma successiva incarico .....                                                                                               | 43 |

### DISCLAIMER

*I principi e le regole di comportamento definiti nel presente documento costituiscono presidi di controllo anche ai fini anticorruzione e di prevenzione dei rischi di compliance e dei rischi-reato ex D. Lgs. 231/2001 dando attuazione a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalle Società ai sensi del d.lgs. 231/2001 (Modello 231), dal Codice Etico del Gruppo FS Italiane, dalla Policy Anti-Corruption del Gruppo FS Italiane e dal Modello di Gestione Anti-Corruption<sup>1</sup>, dal Framework di Data Protection e dal Framework di classificazione e protezione della riservatezza della informazione del Gruppo FS Italiane.*

*Si raccomanda ai Responsabili delle strutture coinvolte il costante monitoraggio del presente documento al fine di garantirne la corretta applicazione ed il costante adeguamento ai fini della sua efficacia. Chiunque venisse a conoscenza di eventuali violazioni o tentata elusione del presente documento è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e/o il Comitato Etico di Società, secondo le modalità previste dalla Procedura per la Gestione delle Segnalazioni e dal Modello 231.*

### PRESIDI DI CONTROLLO

- ☒ D.lgs. 231/2001
- ☒ Anti-Corruption

<sup>1</sup> Ove adottato dalla Società. Il modello è stato pubblicato nella sua prima edizione con la denominazione “Anti-Bribery&Corruption management system” (DdG n. 247 P/AD del 23/02/2018 e corrispondenti documenti societari). Nel rispetto delle proprie peculiarità, Anas SpA ha adottato un proprio modello volontaristico di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione e trasparenza.

## AMBITO DI APPLICAZIONE

- Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
- Società del Gruppo FS Italiane coinvolte nel Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (MOST) e ulteriori società controllate che dovessero successivamente aderire al MOST.

## ATTO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO ☒

### MODALITÀ DI ADOZIONE SOCIETARIA

Il presente documento è un atto di direzione e coordinamento a valenza di Gruppo<sup>2</sup>.

Le Capogruppo di Settore e le altre Società soggette a direzione e coordinamento di FS SpA, adottano, nel rispetto delle proprie prerogative di autonomia ed indipendenza, il presente documento (atto di adozione).

Inoltre, le Capogruppo di Settore con il medesimo atto provvedono al recepimento del documento nell'ambito del rispettivo Polo (atto di recepimento di Polo).

Successivamente, le Società del Polo adottano il presente documento (atto di adozione).

In relazione alle peculiarità organizzative del singolo contesto, l'atto di adozione delle Società del Polo, nel caso in cui siano Sub-holding, può avere valenza anche sulle proprie controllate.

Ciascuna Società garantisce la corretta e costante applicazione di quanto definito e ne assicura la massima diffusione al proprio interno ed il relativo controllo attuativo anche presso le proprie controllate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia ed indipendenza di ciascuna Società.

Il presente documento è un atto di direzione e coordinamento a valenza delle società del Gruppo FS Italiane coinvolte nel Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile.

- ☒ Applicabilità diretta
- ☐ Applicabilità con caratterizzazione organizzativa
- ☐ Applicabilità con integrazione
- ☐ Applicabilità con definizione di processo

---

<sup>2</sup> Per Gruppo FS Italiane si intendono le Società italiane controllate da FS S.p.A. ai sensi dell'art. 2359 comma 1, numeri 1) e 2) del codice civile coinvolte nel Centro Nazionale per la Modalità Sostenibile.

## PREMESSA

Il presente documento disciplina il processo, i ruoli e le responsabilità per assicurare la corretta gestione delle attività di sviluppo e rendicontazione dei progetti condotti dalle Società del Gruppo FS Italiane nell'ambito del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (MOST), Programma di Ricerca «CN00000023» “Sustainable Mobility Center” - PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 2 Dalla Ricerca all’Impresa - Linea Investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies”.

Il MOST è di natura pubblico-privata ai sensi del Decreto Direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) n. 3138 del 16 dicembre 2021, modificato con Decreto Direttoriale n. 3175 del 18/12/2021, è partecipato dalle maggiori università italiane, dal CNR e da grandi player industriali nazionali. Il programma del MOST è dedicato alla ricerca di frontiera in ambito tecnologico coerente con le priorità dell’agenda della ricerca europea e con i contenuti del Piano Nazionale della Ricerca 2021- 2027.

## IL GRUPPO FS ITALIANE NEL MOST

Il Centro Nazionale per Mobilità Sostenibile (MOST) è costituito da 49 soggetti partecipanti che includono 25 Atenei e Centri di Ricerca e 24 Enti Privati. Il Centro è strutturato secondo l'impostazione Hub&Spoke: l'Hub coordina 14 Spoke, distribuiti su tutto il territorio nazionale e che realizzano le attività di ricerca.

Il MOST nasce con l'ambizione e l'obiettivo di contribuire all'incremento della domanda e dell'offerta di mobilità sostenibile al fine di implementare soluzioni moderne, sostenibili e inclusive per l'intero territorio nazionale nell'ambito delle seguenti aree di interesse: mobilità aerea, veicoli stradali sostenibili, trasporto per vie d'acqua, trasporto ferroviario, veicoli leggeri e mobilità attiva. Il Centro Nazionale si occuperà di rendere il sistema della mobilità più "green" nel suo complesso e più "digitale" nella sua gestione. Lo farà attraverso soluzioni leggere e sistemi di propulsione elettrica e a idrogeno; sistemi digitali per la riduzione degli incidenti; soluzioni più efficaci per il trasporto pubblico e la logistica; un nuovo modello di mobilità, come servizio, accessibile e inclusivo. Il MOST opera come stimolo e supporto alla ricerca. Si adopera per lo sviluppo e la definizione di nuove competenze e di nuove professionalità e investe in progetti di accelerazione e di scalabilità sul mercato tramite:

- **Formazione** ovvero definizione di percorsi di alta formazione, attività di formazione continua e MOOC (massive open online course), Osservatori dedicati;
- **Programmi di incremento del TRL** (Technology Readiness Level) tramite il lancio di iniziative di accelerazione e scalabilità sul mercato;
- **Living Labs** per la sperimentazione di nuove tecnologie in condizioni reali attraverso infrastrutture Flagship con visibilità internazionale;
- Ampliamento di attività di **Proof Of Concept (POC)** per validare la ricerca e nuove call per aumentare il Technology Readiness Level (TRL).

Nell'ambito delle iniziative di sistema di cui al Decreto Direttoriale n. 3138 del 16 dicembre 2021 sono soggetti beneficiari, per le attività di rispettiva competenza: l'Hub, gli Spoke, i soggetti affiliati e i soggetti che ricevono finanziamenti nell'ambito dei bandi a cascata.

L'**HUB** è il Soggetto attuatore, costituito da Università statali ed Enti pubblici di Ricerca vigilati dal MUR ed include altri soggetti privati, altamente qualificati nella tematica di ricerca oggetto dell'intervento finanziato. L'Hub rappresenta il referente unico per l'attuazione dell'intervento finanziato nei confronti del MUR; svolge le attività di gestione e di coordinamento, riceve le tranche di agevolazioni concesse da destinare alla realizzazione dell'intervento, verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e dai loro affiliati.

Gli **SPOKE** sono i Soggetti esecutori coinvolti nella realizzazione dell'intervento finanziato. Ogni Spoke riceve dall'Hub le agevolazioni in ragione delle attività svolte così come previsto dal progetto approvato e provvede alla rendicontazione all'Hub delle spese proprie e dei soggetti affiliati, sostenute per l'attività di sua competenza. Per la realizzazione delle attività di propria competenza, gli Spoke si avvalgono della collaborazione di altri soggetti giuridici autonomi già esistenti, "soggetti affiliati allo Spoke".

Ferrovie dello Stato Italiane è società affiliata al CNMS (MOST) e attraverso la Struttura Organizzativa Coordinamento FS-MOST di FS Research Centre assicura per il Gruppo la partecipazione al CNMS nonché i connessi adempimenti amministrativi, coordinando le singole Società coinvolte.

FSI Partecipa alle attività di ricerca di tre Spoke<sup>3</sup>:

- **Spoke 4 - Rail Transportation**
- **Spoke 7 - CCAM, Connected Networks and Smart Infrastructures**
- **Spoke 9 - Urban Mobility.**

Nel contesto del MOST (CNMS) possono essere inclusi anche altri progetti oggetto di bandi dedicati (POC, Scalability, Flagship). Anche in tali casi, salvo diverse disposizioni, si applica quanto definito nel presente documento.


Nella tabella seguente è riportato il coinvolgimento delle singole Società del Gruppo FS Italiane nei tre Spoke.

| SOCIETÀ CONTROLLATE            | SPOKE 4  | SPOKE 7  | SPOKE 9  |
|--------------------------------|----------|----------|----------|
| ANAS                           |          | <b>X</b> |          |
| BUSITALIA                      |          |          | <b>X</b> |
| FS SISTEMI URBANI              |          |          | <b>X</b> |
| ITALFERR                       | <b>X</b> |          | <b>X</b> |
| MERCITALIA INTERMODAL          | <b>X</b> |          |          |
| MERCITALIA SHUNTING & TERMINAL | <b>X</b> |          |          |
| RFI                            | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| TRENITALIA                     | <b>X</b> |          |          |

<sup>3</sup> Si rimanda alla intranet aziendale WE o al sito istituzionale FS Italiane per eventuali approfondimenti inerenti agli Spoke in cui è coinvolta Ferrovie dello Stato Italiane.

## SINTESI DEL PROCESSO

Viene di seguito riportata una sintesi delle fasi principali del processo di sviluppo e rendicontazione dei progetti MOST, descritte più dettagliatamente nei paragrafi successivi, in particolare per quanto attiene alle attività operative di rendicontazione:

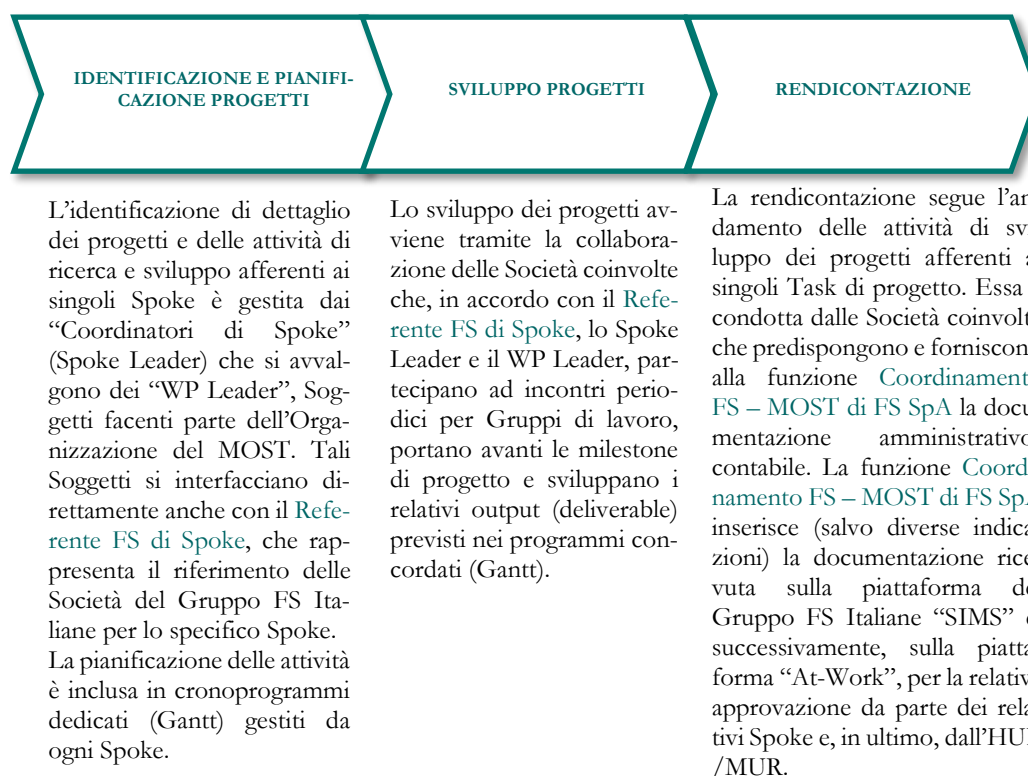



## IDENTIFICAZIONE E PIANIFICAZIONE DEI PROGETTI



Il quadro di riferimento per l'identificazione dei progetti e la relativa pianificazione è rappresentato nei documenti di riferimento relativi al MOST (v. Allegato "Riferimenti Normativi") ed in particolare il Decreto Direttoriale n° 1033 del 17/06/2022 (allegato A - "Programma di Ricerca" e Allegato C - "Cronoprogramma di attuazione e Piano dei pagamenti").

Tutti gli Spoke presenti nell'ambito del MOST presentano una suddivisione delle attività di progetto in Work Package (WP), a loro volta suddivisi in Task, ossia in linee di attività, coordinate da WP Leader dedicati, che sono identificate in accordo con le Società che collaborano allo sviluppo delle stesse. Successivamente, sono definite le tempistiche di sviluppo ed i relativi output (deliverable) da produrre.

Per ogni Spoke viene condiviso un programma (Gantt) complessivo nel quale sono riportati tutti i WP, i Task ed i deliverable previsti, suddivisi per mese di riferimento nell'ambito del periodo complessivo di durata del Programma MOST. Ogni cronoprogramma è definito dalle singole Società coinvolte nei vari Spoke e coordinato dagli Spoke Leader e dai WP Leader. Le Società del Gruppo FS Italiane coinvolte contribuiscono alla condivisione delle informazioni presenti nei singoli cronoprogrammi, secondo modalità, tempistiche e modelli definiti dai singoli Spoke.

La funzione **Coordinamento FS-MOST di FS SpA** partecipa, anche tramite i **Referenti FS di Spoke**, agli incontri di condivisione e definizione delle informazioni, interfacciandosi con le Società del Gruppo FS Italiane per fornire agli Spoke le versioni concordate e finali dei cronoprogrammi. Questi ultimi, una volta finalizzati, sono inviati dagli Spoke all'HUB e rappresentano la base di riferimento per lo sviluppo delle attività afferenti ai singoli Task. Ogni eventuale aggiornamento dei singoli cronoprogrammi, rispetto a quelli condivisi con l'HUB, deve essere preventivamente concordato dalle Società del Gruppo FS Italiane con la funzione **Coordinamento FS-MOST di FS SpA** e, successivamente, con gli Spoke Leader.

Ogni Società del Gruppo FS Italiane predispone, per ciascuno Spoke, WP e Task, specifiche "Schede Progetto" (v. Allegato 2.1) che includono, tra le altre informazioni, la proposta progettuale da sviluppare (caso d'uso), gli obiettivi specifici da raggiungere, gli output/deliverable previsti, gli importi da rendicontare – suddivisi, ove applicabile, per tipologia in: "Ricerca industriale", "Studi di fattibilità", "Investimenti infrastruttura" –, il numero di ore previste per tipologia di risorsa da dedicare al progetto, le risorse coinvolte, eventuali indicazioni in merito ai vincoli di proprietà intellettuale ed il cronoprogramma di riferimento. Le Schede Progetto, nella forma finale, devono essere inviate al **Referente FS di Spoke** che, una volta controllate nei contenuti, per quanto attiene alla coerenza delle informazioni riportate in relazione alle azioni concordate con gli Spoke, provvede ad inserirle sulla piattaforma SIMS (Strategic Information Management System)<sup>4</sup> nelle cartelle dedicate per singolo Spoke/WP/Task.

<sup>4</sup> Tale inserimento avverrà a partire dal momento in cui sarà disponibile su SIMS la piattaforma per il caricamento dei dati relativi al MOST. In fase transitoria la gestione della documentazione è effettuata tramite l'utilizzo di OneDrive condiviso tra i soli soggetti appartenenti a Coordinamento FS-MOST.

## SVILUPPO DEI PROGETTI



Lo sviluppo delle attività di progetto avviene secondo quanto definito nei cronoprogrammi e nelle schede progetto. Lo svolgimento consta di varie attività riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti: partecipazione a riunioni (interne all'Azienda, organizzate dall'HUB, dagli Spoke, da FS Italiane, ecc.), sviluppo di contributi tecnici per documenti/deliverable previsti per Spoke/WP oppure per adempimenti delle Società verso FS, partecipazione a test in sito o in laboratorio, sopralluoghi, attività di supporto tecnico per l'acquisto di beni ed attrezzature necessari per l'utilizzo nei progetti.

Ogni attività di progetto (caso d'uso) identificata nell'ambito dei cronoprogrammi e delle schede progetto, viene sviluppata dai Soggetti coinvolti per singolo WP e Task, secondo il cronoprogramma definito.

Ciascuna Società del Gruppo FS Italiane coinvolta nei singoli Spoke, provvede a registrare le proprie attività in apposite "Schede avanzamento attività FS-MOST" (Allegato 2.2) che includono in forma semplificata le attività svolte per ogni mese di riferimento. Tali schede di avanzamento vengono inviate entro il 14 del mese successivo a quello di riferimento al [Referente FS Spoke](#) che, previa verifica dei contenuti per quanto attiene agli aspetti amministrativi, alla coerenza con lo stato di avanzamento complessivo dello Spoke, e con le informazioni derivanti dagli incontri dei vari gruppi di lavoro, provvede ad archivarle in SIMS (Strategic Information Management System), nella cartella dedicata, per eventuali controlli da parte di soggetti terzi incaricati, unitamente alla documentazione amministrativo-contabile, archiviata in altre cartelle specifiche.

Al fine di monitorare lo svolgimento delle attività, la funzione [Coordinamento FS-MOST di FS SpA](#) organizza incontri, con cadenza almeno trimestrale, con le Società controllate coinvolte per singolo Spoke.

Ogni documento/file (informazione documentata) rilevante come evidenza di attività svolte nell'ambito dei singoli Spoke/WP/Task ai fini dello stato di avanzamento, deve essere archiviato accuratamente da ogni Società coinvolta nei progetti MOST, in apposite cartelle informatiche che consentano di risalire alle principali informazioni necessarie ai fini della rintracciabilità (es: data di redazione, nominativo del redattore, codifiche d'identificazione, ecc.), secondo le procedure di riferimento delle singole Società.

Tale criterio deve essere applicato anche nei casi di documenti/file riguardanti contributi per documenti prodotti da altre Società coinvolte nel MOST; in questi casi devono essere archiviati i singoli documenti che forniscono evidenza dei contributi resi, nelle ultime versioni fornite.

Tutta la documentazione archiviata per fornire evidenza dell'avanzamento delle attività progettuali potrà essere sottoposta a verifica da parte della funzione [Coordinamento FS-MOST di FS SpA](#), dell'HUB e/o del MUR, dell'Unità di Audit, dei referenti della Commissione europea e da parte di altri organismi autorizzati, al fine di accertare la corretta modalità di archiviazione e la rintracciabilità, nonché la coerenza dei contenuti in relazione alle attività dello Spoke.

## RENDICONTAZIONE



La rendicontazione delle attività da parte di tutti i soggetti coinvolti nel programma di ricerca nell'ambito del MOST avviene tramite l'utilizzo della piattaforma "At Work" del MUR, che interagisce con la piattaforma "Regis" anche ai fini della rendicontazione da parte del MUR all'Unione Europea nell'ambito dei progetti PNRR.

Nell'ambito dei progetti MOST, l'avanzamento delle attività di studio e ricerca dovrà essere rendicontato sia per gli aspetti necessari ad assicurare il corretto conseguimento dei traguardi e degli obiettivi (Milestone e Target), sia per quelli necessari ad assicurare che le spese sostenute per la realizzazione dei progetti siano regolari e conformi alla normativa vigente e congruenti con i risultati raggiunti.

Gli Spoke producono la documentazione di rendicontazione, che si compone della Relazione sull'avanzamento del progetto (format "Relazione Trimestrale di Progetto"; la cui compilazione è a cura dei Coordinatori di Spoke) relativo alle attività e del Rendiconto di progetto (format presente in At Work; la compilazione, a cura dei Coordinatori di Spoke, avviene tramite estrapolazione dei dati dalla piattaforma) relativo alle procedure espletate ed alle spese sostenute. Le relazioni tecniche sullo stato di avanzamento, la documentazione attestante il raggiungimento degli obiettivi intermedi del progetto, gli atti e i documenti inerenti alle procedure di selezione, le evidenze delle spese sostenute ed ogni ulteriore documentazione giustificativa a supporto, oltre alle check list di autocontrollo sono caricati nel sistema informatico "At Work".

Le Società del Gruppo FS Italiane coinvolte nei progetti, come "Soggetti Esecutori", contribuiscono alla fornitura di dati, informazioni e documenti tali da poter attestare l'avanzamento fisico e contabile delle attività svolte in modo da consentire agli Spoke di rendicontarli secondo le regole definite.

Il processo di rendicontazione prevede la definizione della "massa critica", ossia l'identificazione del personale delle società del Gruppo FS Italiane coinvolto in uno specifico Spoke, e la registrazione dello stesso nella piattaforma "At Work" del MUR, previo incarico formalmente assegnato dalle singole Società Controllate alle risorse coinvolte.

La [funzione Coordinamento FS - MOST](#) di FS SpA ed i [Referenti FS di Spoke](#), provvedono ad inserire nella piattaforma "At Work" tutta la documentazione prodotta dalle Società Controllate coinvolte nei tre Spoke.

### FLUSSO OPERATIVO DI RENDICONTAZIONE

I criteri e le modalità da utilizzare per la rendicontazione sono inclusi nella "Linee guida per la rendicontazione del MUR delle iniziative di sistema missione 4 componente 2" (Versione 1.0 del 10 ottobre 2022),

nel seguito richiamate sinteticamente come “Linee guida”, nei documenti in Allegato (riferimenti normativi esterni) e nell’Allegato 1 “Obblighi e modalità operative di rendicontazione amministrativo-contabile inerenti alla predisposizione della documentazione”. Le disposizioni sulla rendicontazione sono destinate al soggetto attuatore (HUB), ai soggetti esecutori (Spoke) e affiliati allo Spoke (società pubbliche o private che partecipano alla realizzazione del programma di ricerca), come Ferrovie dello Stato Italiane SpA che, con le società controllate partecipanti agli Spoke, costituisce un’unica entità per la rendicontazione.


Il cronoprogramma di attuazione (allegato C del Decreto Direttoriale del MUR n.1033 del 17/06/2022), aggiornato dal MUR in accordo con HUB, prevede la rendicontazione degli affiliati privati per le linee di attività svolte (milestone M13-M14-M15), nel periodo dal 01/03/2023 al 31/08/2025, con la possibilità di un’estensione del progetto, autorizzata dal MUR per un massimo di sei mesi, non oltre la data del 28 febbraio 2026.

Entro le tempistiche sopra definite, tutte le attività del Programma di ricerca dovranno essere concluse ed i relativi target finali conseguiti nel rispetto dell’Allegato A del Decreto di Concessione del finanziamento, le spese dovranno essere state sostenute e rendicontate ed i trasferimenti di risorse dovranno essere stati completati.

Il flusso operativo di rendicontazione, gestito dalla [funzione Coordinamento FS – MOST di FS SpA](#), per quanto attiene all’interfaccia con Spoke/HUB, prevede la **predisposizione della documentazione** inerente all’impegno del personale, alle consulenze esterne, agli acquisti di materiale, agli strumenti, alle attrezzature e alle altre spese sostenute da parte delle società controllate da FS SpA, per il Programma di Ricerca “Sustainable Mobility Center” (Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile – CNMS) Codice «CN00000023» - PNRR Missione 4 – Componente 2 - Linea Investimento 1.4. Le spese da rendicontare devono rispettare i valori di budget e la pianificazione ore/risorse, previsti da ogni società controllata di FS SpA per ogni specifico Spoke.

Nella fase successiva, le società controllate **inviando** via e-mail (salvo diversa indicazione) alla [funzione Coordinamento FS - MOST di FS SpA](#) i documenti secondo le previsioni del MUR, per l’inserimento nel sistema SIMS (Strategic Information Management System) di FS SpA gestito dalla [funzione Decision Support Models di FS SpA](#).

La [funzione Coordinamento FS - MOST di FS SpA](#) **inserisce la documentazione sulla piattaforma “At Work”** per sottoporla a controllo da parte dello Spoke e successivamente dell’HUB per l’**approvazione** quale giustificativo di spesa ammessa (vedi figura 1).

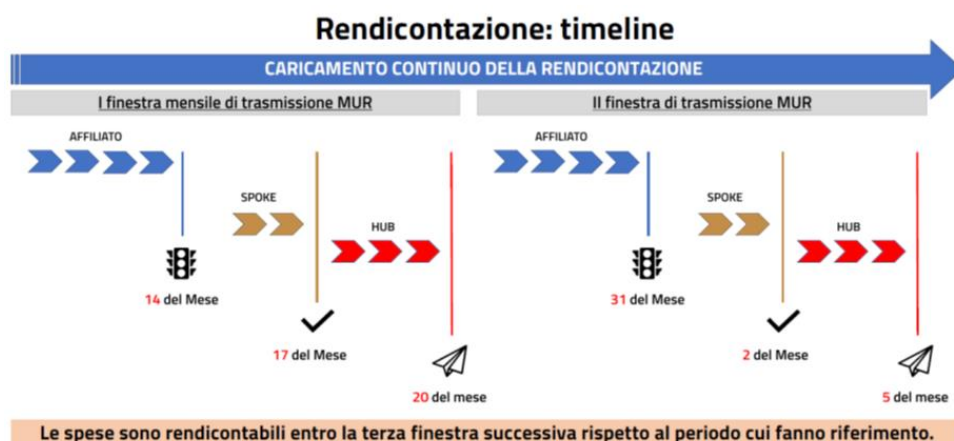

**Figura 1**

Le spese possono essere rendicontate entro la terza finestra di rendicontazione successiva rispetto al periodo cui fanno riferimento, ovvero entro il termine di 45 giorni dalla scadenza prevista per la rendicontazione.

Le Società controllate inviano alla [funzione Coordinamento FS – MOST di FS SpA](#) tutta la documentazione prevista per la rendicontazione nel periodo di riferimento, entro i primi 10 giorni dell'ultima finestra di rendicontazione, salvo diversa comunicazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli e l'inserimento nella piattaforma.

L'importo massimo rendicontabile è indicato nel budget dell'Affiliato per Spoke, di cui all'Allegato B - Piano dei Costi e delle Agevolazioni del Decreto Direttoriale n.1033 del 17/06/2022. Ogni variazione di budget deve essere richiesta dall'Affiliato all'HUB tramite lettera con descrizione/motivazione della variazione, preventivamente discussa ed elaborata confrontandosi con lo Spoke Leader. Detta richiesta deve essere accompagnata dalla tabella budget aggiornata (gestita dagli Spoke Leader di concerto con l'HUB) riportante la suddivisione di spesa per Spoke, tipologia di attività/ categoria di spesa/ milestone. Qualora la variazione comporti una modifica degli importi al decreto/contratto, la lettera è inviata anche per PEC all'HUB. Dopo opportune analisi, lo Spoke Leader può approvare/rifiutare. In caso di accoglimento, lo Spoke trasmette tale variazione all'HUB, per accettare/autorizzare/rifiutare in base all'impatto che detta variazione determina rispetto ai contenuti di cui agli Allegati B e C (es: modifiche significative sul cronoprogramma spese, sulle finalità dell'intervento, sul conseguimento di milestone e target, ecc.).

Successivamente l'HUB, in base alle erogazioni del MUR, procede all'**erogazione del finanziamento** a FS SpA considerando le spese ammissibili e il conseguimento degli obiettivi fissati.

Il contributo maturato, pari al 50% dell'ammontare delle spese ammissibili, è corrisposto dall'HUB a FS SpA, con accredito sul conto corrente dedicato preventivamente comunicato all'HUB.

Le società controllate sono direttamente responsabili dei dati forniti a FS SpA, in base ai quali ricevono i finanziamenti pervenuti a FS SpA dall'HUB.

La [funzione Coordinamento FS - MOST di FS SpA](#) comunica alla [funzione Administration, Finance & Control di FS SpA](#) gli importi spettanti a ciascuna società controllata per eseguire le operazioni di riversamento delle somme dovute alle società controllate.

## Predisposizione della documentazione

FS SpA e le Società Controllate nella predisposizione della documentazione di rendicontazione rispettano gli obblighi generali e le modalità operative di rendicontazione amministrativo-contabile (per cui si rimanda all'allegato 1). I dati sono trattati nel rispetto del *Framework Data Protection* del Gruppo FS, della Policy Anti-Corruption del Gruppo FS, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, di cui al D. Lgs. n. 231/2001, del Modello di Gestione Anti-Corruption adottato dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e del Codice Etico.

## Invio documentazione e inserimento nel SIMS

La documentazione di rendicontazione predisposta viene inviata da ogni società controllata via e-mail (salvo diversa indicazione) al **Referente FS di Spoke**, al Referente amministrativo e per conoscenza al **Responsabile della funzione Coordinamento FS – MOST di FS SpA**.

Le società controllate sono direttamente responsabili dei contenuti, della veridicità e aggiornamento della documentazione inviata. La **funzione Coordinamento FS – MOST di FS SpA** ne verifica la completezza, la chiarezza, la tracciabilità e la presenza dei dati obbligatori previsti dalle “linee guida”, al fine di evitare eventuali mancate ammissioni delle spese da parte dello Spoke.

Successivamente la **funzione Coordinamento FS-MOST di FS SpA** carica i dati nel sistema SIMS (Strategic Information Management System) di FS per il loro consolidamento per Spoke. L'inserimento in SIMS viene effettuato anche tramite specifica modulistica sviluppata dalla **funzione Coordinamento FS-MOST di FS SpA** (es: Prospetto dei dati del personale, Prospetto dei costi per materiali, strumenti e attrezzature, ecc.).

## Inserimento in “At Work”

Tramite la piattaforma “At Work” la funzione **Coordinamento FS-MOST di FS SpA** trasmette allo Spoke Leader tutta la documentazione delle varie tipologie di spesa, ricevuta dalle Società controllate, generando per ogni attività caricata e inviata un'apposita codificazione con codice di attività (Cod\_Att) e relativo codice identificativo (Cod\_Pag). Una volta che l'HUB ha redatto il rendiconto, non è possibile apportare modifiche alle attività inserite.

L'inserimento dei dati sulla piattaforma “At Work” può avvenire con due finestre mensili:

- tra l'1 ed il 14 del mese;
- tra il 15 ed il 31 del mese,

per consentire allo Spoke/HUB il rispetto degli obblighi verso il MUR.

## Approvazione

Lo Spoke Leader verifica la conformità delle spese e della documentazione trasmessa. Se il controllo di conformità è superato positivamente, lo Spoke Leader approva i Cod\_Pag che vengono automaticamente



inviati all'HUB per i controlli di gestione e amministrativo-contabili.

In caso di esito positivo l'HUB valida le spese e trasmette il rendiconto al MUR. In caso di irregolarità rilevate dallo Spoke Leader o dall'HUB, la società controllata sarà informata dalla funzione **Coordinamento FS-MOST di FS SpA** per provvedere alle dovute correzioni.

La società controllata deve consentire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dall'HUB e/o dal MUR, dall'Unità di Audit, dai referenti della Commissione europea e da altri organismi autorizzati, al fine di accertare la regolarità della procedura, la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese.

### **Erogazione finanziamento**

L'erogazione del finanziamento avviene nel rispetto della procedura di erogazione delle agevolazioni prevista dal Decreto Ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021 e ss.mm.ii. e in coerenza con il Cronoprogramma di Attuazione e Piano dei pagamenti di cui all'Allegato C del Decreto di Concessione del finanziamento.

Il pagamento delle agevolazioni avviene esclusivamente da parte dell'HUB, entro dieci giorni dalla data di avvenuta acquisizione da parte del MUR, dandone avviso all'Affiliato, ed è subordinato all'erogazione delle medesime agevolazioni da parte del MUR.

FS trasferirà alle società controllate i finanziamenti ricevuti dall'HUB, spettanti sulla base delle spese rendicontate.

Firmato  
Massimo Bruno

| ACRONIMI | DESCRIZIONE                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| CCAM     | Connected, Cooperative & Automated Mobility                 |
| CCNL     | Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro                   |
| CdA      | Consiglio di Amministrazione                                |
| CIG      | Codice Identificativo di Gara                               |
| COR      | Codice identificativo aiuto (di Stato)                      |
| CNR      | Consiglio Nazionale delle Ricerche                          |
| CRO      | Codice Riferimento Operazione                               |
| CUP      | Codice Unico di Progetto                                    |
| DDT      | Documento di Trasporto                                      |
| DNSH     | Do No Significant Harm                                      |
| DOr      | Disposizione Organizzativa                                  |
| DSAN     | Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio                   |
| DURC     | Documento Unico di Regolarità Contributiva                  |
| DURF     | Documento Unico Regolarità Fiscale                          |
| ETCS     | European Train Control System                               |
| ETS      | European Trading System                                     |
| FAQ      | Frequently Asked Questions                                  |
| FRMCS    | Future Railway Mobile Communication System                  |
| FS       | Ferrovie dello Stato Italiane                               |
| GSM-R    | Global System for Mobile Communications – Railway           |
| HSR      | High Speed Rail                                             |
| MEF      | Ministero dell'Economia e delle Finanze                     |
| MIMS     | Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili |
| MOOC     | Massive Open Online Course                                  |



| ACRONIMI           | DESCRIZIONE                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| <b>MOST (CNMS)</b> | Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile    |
| <b>MUR</b>         | Ministero dell'Università e della Ricerca       |
| <b>NFV</b>         | Network functions virtualization infrastructure |
| <b>ODS</b>         | Ordine di Servizio                              |
| <b>PEC</b>         | Posta Elettronica Certificata                   |
| <b>PNRR</b>        | Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza         |
| <b>POC</b>         | Proof of Concept                                |
| <b>RFC</b>         | Rail Freight Corridors                          |
| <b>RNA</b>         | Registro Nazionale Aiuti di Stato               |
| <b>SIMS</b>        | Strategic Information Management System         |
| <b>TRL</b>         | Technology Readiness Level                      |
| <b>TSM</b>         | Train System Models                             |
| <b>VAS</b>         | Valutazione Ambientale Strategica               |
| <b>WP</b>          | Work Package                                    |

| DEFINIZIONI                          | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COMPONENTE</b>                    | Elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>DO NO SIGNIFICANT HARM (DNSH)</b> | Principio del “non arrecare danno significativo” secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>HUB</b>                           | Soggetto attuatore, costituito da Università statali ed Enti pubblici di Ricerca vigilati dal MUR e può prevedere il coinvolgimento di Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca e di altri soggetti pubblici o privati, altamente qualificati nella tematica di ricerca oggetto dell'intervento finanziato. rappresenta il referente unico per l'attuazione dell'intervento finanziato nei confronti del MUR. Svolge le attività di gestione e di coordinamento, riceve le tranche di agevolazioni concesse da destinare alla realizzazione dell'intervento, verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e loro affiliati. |
| <b>MILESTONE</b>                     | Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>MISSIONE</b>                      | Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree “tematiche” strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).                                                                                                                                                                                             |
| <b>“PNRR” o Piano</b>                | Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza presentato dall'Italia a norma del Reg. (UE) 2021/241 approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>SPOKE</b>                         | Soggetti esecutori coinvolti nella realizzazione dell'intervento finanziato. Ogni Spoke riceve dall'Hub le agevolazioni in ragione delle attività svolte così come previste dal progetto approvato e provvede alla rendicontazione all'Hub delle spese proprie e dei soggetti affiliati, sostenute per l'attività di sua competenza. Per la realizzazione delle attività di propria competenza, gli Spoke possono avvalersi, attraverso la formalizzazione di specifici accordi, della collaborazione di altri soggetti giuridici autonomi già esistenti, “soggetti affiliati allo Spoke”.                                                                                    |
| <b>SOGGETTO AFFILIATO ALLO SPOKE</b> | Soggetto pubblico o operatore economico privato di cui lo Spoke può avvalersi nella realizzazione delle attività tematiche di propria competenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>SOGGETTO ATTUATORE</b>            | Soggetto responsabile (Hub) dell'avvio, dell'attuazione e della gestione del Centro Nazionale. È costituito da Università statali ed Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR e può prevedere il coinvolgimento di Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca e di altri soggetti pubblici o privati che svolgono attività di ricerca, altamente qualificati. In particolare, l'art.1, comma 4, lett. o) del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29                                                                                                                                                                    |

| DEFINIZIONI                  | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: “i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR.                                                                                                                                                                                       |
| <b>SOGGETTO BENEFICIARIO</b> | Ogni soggetto di natura giuridica pubblica e privata che riceve agevolazioni a valere sul presente Avviso. Sono soggetti beneficiari, per le attività di rispettiva competenza: lo Hub, gli Spoke, i soggetti affiliati e i soggetti che ricevono finanziamenti nell’ambito dei bandi a cascata.                                                     |
| <b>SOGGETTO ESECUTORE</b>    | Soggetto pubblico o operatore economico privato (Spoke) coinvolto nella realizzazione del Programma di Ricerca ed individuato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile. I rapporti tra lo Hub e gli Spoke sono disciplinati con accordi scritti.                                                                             |
| <b>SOGGETTO PROPONENTE</b>   | Università statale o Ente Pubblico di Ricerca vigilato dal MUR, che ha presentato la proposta progettuale                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TARGET</b>                | Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.). |



## ALLEGATO: RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI

| RUOLO                             | DATA       | STRUTTURA ORGANIZZATIVA                                                                                    | DOCUMENTO DI RIFERIMENTO        |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| FS Research Centre                | 19/03/2024 | Struttura <b>FS RESEARCH CENTRE</b> in ambito CORPORATE AFFAIRS                                            | DOr n. 22/AD del 05/06/2023     |
| Coordinamento FS-MOST             | 19/03/2024 | Struttura <b>COORDINAMENTO FS - MOST</b> in ambito CORPORATE AFFAIRS/FS RESEARCH CENTRE                    | DOr n. 24/COA-HR del 05/06/2023 |
| Referente FS di Spoke             | 19/03/2024 | Struttura <b>SPOKE URBAN MOBILITY</b> in ambito CORPORATE AFFAIRS/FS RESEARCH CENTRE/COORDINAMENTO FS-MOST | DOr n. 24/COA-HR del 05/06/2023 |
| Decision Support Models           | 19/03/2024 | Struttura <b>DECISION SUPPORT MODELS</b> in ambito CORPORATE AFFAIRS/FS RESEARCH CENTRE                    | DOr n. 24/COA-HR del 05/06/2023 |
| Research & Science Advisor        | 19/03/2024 | Struttura <b>RESEARCH &amp; SCIENCE ADVISOR</b> in ambito CORPORATE AFFAIRS/FS RESEARCH CENTRE             | DOr n. 24/COA-HR del 05/06/2023 |
| Administration, Finance & Control | 19/03/2024 | Chief Financial Officer - Struttura <b>ADMINISTRATION, FINANCE &amp; CONTROL</b>                           | DOr n. 22/AD del 05/06/2023     |

<sup>1</sup> L'Allegato "Riferimenti Organizzativi" sarà aggiornato, a firma del responsabile risorse umane e organizzazione di Società, senza necessità di rimettere il presente documento, in caso di modifiche organizzative che non abbiano impatti sul processo descritto e sulle connesse responsabilità delle strutture coinvolte, ma solo sul naming delle stesse o sulla loro collocazione organizzativa in ambito societario.

**ACCOUNTABILITY:** chiara definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti che, nell'ambito delle funzioni ricoperte e nel conseguimento dei correlati obiettivi, partecipano attivamente e, per i profili di competenza, assumono le relative responsabilità in relazione alle diverse fasi del processo e di individuazione, mitigazione e monitoraggio dei relativi rischi identificati.

**CONTRIBUTO ALLA IDENTIFICAZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI:** consentire che i principali rischi siano identificati, valutati, mitigati e monitorati, al fine di supportare il management nell'assunzione di decisioni consapevoli ed allo scopo di minimizzare gli impatti degli stessi sul raggiungimento degli obiettivi cui sono collegati e sulla reputazione della Società.

**SEGREGAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ:** rispetto del principio della segregazione delle responsabilità in base al quale deve essere garantito che il responsabile dell'attività operativa sia sempre un soggetto distinto da quello che esegue le attività di controllo e di monitoraggio della stessa.

**IMPARZIALITÀ E ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE:** i dipendenti delle Società del Gruppo coinvolti nel processo devono operare con professionalità e imparzialità evitando ogni conflitto di interesse, ossia una situazione in cui la detenzione, anche indiretta o per conto di terzi, di un interesse secondario interferisce o potrebbe interferire con la capacità di agire nell'interesse primario della Società. Il dipendente che si trovi in una siffatta situazione è tenuto a darne tempestiva comunicazione al proprio superiore per le determinazioni del caso e ad astenersi, nelle more, dall'assunzione di decisioni o dallo svolgimento di attività in conflitto con gli interessi del Gruppo.

**SISTEMA DI DELEGHE E POTERI:** definizione formale di deleghe e poteri di firma, in coerenza con le posizioni organizzative e le missioni/responsabilità assegnate, da esercitarsi secondo le modalità ed entro i limiti di valore predefiniti.

**RISERVATEZZA:** fermi restando la trasparenza delle attività poste in essere e gli obblighi di informazione imposti dalle disposizioni vigenti, è obbligo delle risorse che operano nelle diverse fasi del processo di garantire la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia/informazione appresa in ragione della propria funzione lavorativa, anche in relazione alla particolare sensibilità di alcuni dati trattati. Le metodologie e gli strumenti per la protezione della riservatezza delle informazioni sono orientati a garantire l'integrazione con i processi aziendali nella ricerca della massima efficienza ed evitando la ridondanza dei controlli.

**CREAZIONE DI VALORE:** le attività previste all'interno del documento concorrono alla creazione di valore per il Gruppo, i clienti, il personale e gli altri stakeholder, favorendo il miglioramento continuo dei processi, dei modelli di governance e degli strumenti di organizzazione, gestione e controllo attraverso l'aggiornamento professionale delle risorse coinvolte nel processo, implementazione e continuo miglioramento dei sistemi di monitoraggio e reporting.

**TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE:** i soggetti coinvolti nelle diverse fasi del processo devono garantire, ciascuno per la parte di propria competenza, la tracciabilità delle attività svolte e l'archiviazione, ove possibile anche tramite l'utilizzo di adeguati supporti informatici, della relativa documentazione, assicurando, nel tempo, l'individuazione e la ricostruibilità ex post delle fonti e degli elementi informativi che supportano le attività.

**Riferimenti normativi interni**

- Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo adottato dalle Società del Gruppo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001
- Codice Etico del Gruppo FS Italiane
- Modello di Compliance del Gruppo FS Italiane
- Framework di Data Protection
- Modello di Governance del Gruppo FS Italiane
- Modello di Governance Security
- Social Media Policy del Gruppo FS Italiane
- Policy Anti-Corruption del Gruppo FS Italiane e Modello di Gestione Anti-Corruption adottato dalle Società
- Lettere di impegno per regolare i reciproci conferimenti a titolo di quota annuale di adesione alla Fondazione “Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile” delle seguenti Società controllate: ANAS S.p.A., BusItalia Sita Nord s.r.l., FS Sistemi Urbani s.r.l., Italferr S.p.A., Mercitalia Shunting & Terminal s.r.l., Mercitalia Intermodal S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A.
- Accordo tra Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile e Ferrovie dello Stato Italiane per la regolamentazione dei rapporti tra HUB e Affiliati relativi all’attuazione del Programma di ricerca CN00000023 “Sustainable Mobility Center (Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile – CNMS)” e alla realizzazione delle attività di ricerca ad esso sottese, finanziato dal Decreto Direttoriale di concessione del finanziamento n.1033 del 17.06.2022 a valere sulle risorse del PNRR MUR – M4C2 – Investimento 1.4 - Avviso “Centri Nazionali” - D.D. n. 3138 del 16 dicembre 2021 (stipulato in data 18/10/2023).

**Riferimenti normativi esterni**

Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi generali:

- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L57 del 18 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell’Unione Europea, come integrato dal Regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione del 28 settembre 2021 e dal Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la relativa Comunicazione della Commissione Europea C(2021) 1054 del 12 febbraio 2021, recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa

e la resilienza”

- Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01 “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” e ss.mm.ii.
- Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e ss.mm.ii.
- Comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 46/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 322 del 30 dicembre 2020)
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito “PNRR”), ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021
- Linee Guida definite dal Ministero dell’Università e della Ricerca per le iniziative di sistema della M4C2, approvate con Decreto Ministeriale n. 1141 del 7 ottobre 2021, condivise con la Cabina di Regia del PNRR
- Decreto Ministeriale del MUR n. 1314 del 14/12/2021, recante “Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie”, emanato dal MUR in attuazione della suindicata riforma 1.1 della M4C2 e successivamente modificato con Decreto Direttoriale 24 dicembre 2021, n. 1368
- Decreto Direttoriale del MUR n. 3138 del 16/12/2021, modificato con Decreto Direttoriale n. 3175 del 18/12/2021, recante un “*Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S su alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali di R&S” su alcune Key Enabling Technologies”* finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”
- Nota del Ministero della Transizione Ecologica del 17 marzo 2022, n. 34710, avente ad oggetto chiarimenti in merito agli adempimenti VAS e DNSH
- Decreto Direttoriale del MUR n. 548 del 31/03/2022 di approvazione delle graduatorie delle proposte pervenute in risposta all’Avviso, con la contestuale ammissione alla successiva Fase 2 delle suddette proposte, ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso; con il medesimo Decreto Direttoriale 31 marzo 2022, n. 548, è stata approvata la proposta progettuale presentata dal Politecnico di Milano (Polimi) per la costituzione del “*Sustainable Mobility Center (Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile – CNMS)*”, relativa all’Area Tematica: “*Mobilità sostenibile*” – Progetto CN00000023
- Atto a rogito del notaio Dott.ssa Susanna Schneider di Settimo Milanese, in data 9 giugno 2022, repertorio n. 167/54, registrato a Milano - DP II in data 27 giugno 2022 al numero 68085 serie 1T,



con il quale il Soggetto Attuatore del “*Sustainable Mobility Center (Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile – CNMS)*” si è costituito nella forma di Fondazione denominata “*Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile*” (CF 97924630151)

- Decreto Direttoriale del MUR n.1033 del 17/06/2022 registrato dalla Corte dei Conti in data 08/07/2022 al n. 1827, completo dei seguenti allegati:

Allegato A - Programma di ricerca

Allegato B - Piano dei Costi e delle Agevolazioni

Allegato C - Cronoprogramma di attuazione e Piano dei pagamenti

Allegato D - Disciplinare di concessione delle agevolazioni prot. n.12575 del 20/07/2022;

Allegato E - Codici Unici di Progetto (CUP) e Codici Concessione RNA – COR,

con il quale è ammesso a finanziamento il Centro Nazionale “Sustainable Mobility Center (Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile – CNMS) tematica “Mobilità sostenibile” domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo CN00000023, per la realizzazione del Programma di Ricerca dal titolo Sustainable Mobility Center (Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile – CNMS)

- Atto d’obbligo e di accettazione del decreto di concessione delle agevolazioni del MUR per il progetto Codice CN00000023 Titolo “Sustainable Mobility Center (Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile – CNMS)” Repertorio n. 39.880 Raccolta n. 15.070 data 30/08/2022 sottoscritto dal soggetto attuatore Fondazione “Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile”
- Linee Guida del MUR per il Monitoraggio destinate al soggetto attuatore “MUR Registro Ufficiale U.0007146 del 26.09.2022” ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni
- Linee Guida del MUR per le azioni di informazione e comunicazione a cura dei soggetti attuatori “MUR Registro Ufficiale U.0007553 del 10.10.2022” ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni
- Linee Guida del MUR per la Rendicontazione destinate ai soggetti attuatori delle iniziative di sistema missione 4 componente 2 versione 1.0 “MUR Registro Ufficiale U.0007554 del 10.10.2022” ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni
- Linee Guida del MUR per AT WORK Piattaforma per la gestione dei bandi del PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca “MUR Aprile 2023”
- FAQ Centro Nazionale della Mobilità Sostenibile, “MOST Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile versione 1.3 del 27.04.2023
- D.Lgs. n. 231 dell’ 08/06/2001 disposizioni per la responsabilità aziendale
- D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 normativa anticorruzione
- Regolamento Europeo 2016/679 e D. Lgs. n. 101/2018 per la protezione dei dati personali





## ALLEGATO: RIFERIMENTI NORMATIVI

---

- Codice Etico e di Comportamento della Fondazione Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile MOST Versione 0 – Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29/05/2023
- Normativa vigente nell'ambito dei contratti pubblici
- Linee Guida relative alla Proprietà Intellettuale relative al Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (IP Guidelines for CNMS).

## ALLEGATO 1 – Obblighi e modalità operative di rendicontazione amministrativo-contabile inerenti alla predisposizione della documentazione

### *1.1 Obblighi generali*

Di seguito sono riportati i criteri e le regole generali che gli Affiliati devono adottare per l'ammissibilità delle spese al fine di consentire all'HUB di effettuare la rendicontazione al MUR nel rispetto della normativa applicabile (di cui in particolare all'Allegato D - Disciplinare di concessione delle agevolazioni prot.n. 12575 del 20/07/2022 - del Decreto Direttoriale n.1033 del 17/06/2022):

- **Effettività:** la spesa deve essere effettivamente sostenuta e comprovata, derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, ordini, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione all'intervento, i termini di consegna e le modalità di pagamento.
- **Legittimità:** la spesa deve essere contabilizzata in conformità alle Leggi in materia fiscale, contabile, civilistica a livello europeo, nazionale e regionale.
- **Temporalità:** la spesa deve essere sostenuta ed effettivamente pagata durante il periodo di ammissibilità fissato nel Decreto di concessione del finanziamento.
- **Pertinenza e imputabilità:** le spese devono essere intestate e sostenute dagli Affiliati ed essere direttamente imputabili, pertinenti e connesse alle attività previste dal Progetto; se non riferibili al 100 %, è necessario indicarne la quota parte.
- **Tracciabilità:** i pagamenti devono essere tracciabili e verificabili, effettuati mediante bonifico bancario, o assegno non trasferibile intestato al fornitore, con evidenza dell'addebito sul c/c bancario, oppure con carta di credito o di debito a titolarità del Soggetto Beneficiario, con evidenza dell'addebito. Non sono ammessi pagamenti in contanti o con carta di credito personale, né compensazioni. I Soggetti Beneficiari devono istituire un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata, che garantisca una chiara identificazione della spesa relativa al progetto.
- **Il C/C deve essere dedicato (non esclusivo)** al Progetto intestato al Soggetto Beneficiario al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni.
- **Ogni documento amministrativo-contabile deve riportare i riferimenti al progetto** (Es. Acquisto effettuato nell'ambito del Programma di Ricerca «CN00000023» - PNRR Missione 4 - Componente2 - Linea Investimento 1.4 “Sustainable Mobility Center – CNMS” numero CUP assegnato e l'eventuale numero CIG (in caso di gare d'appalto di cui alla L.50/2016 ss.mm.ii.).
- **Il Numero CUP (Codice Unico di Progetto)** assegnato deve essere riportato su tutti i documenti che fanno esplicito riferimento al progetto e in particolare sui documenti amministrativi e contabili.
- **Tutti i Giustificativi di spesa** devono essere conformi agli originali.
- **La conservazione della documentazione progettuale per almeno 5 anni dalla data di conclusione del progetto** deve avvenire in fascicoli cartacei e/o informatici (nel rispetto delle procedure

aziendali di riferimento per la gestione della documentazione, assicurandone la rintracciabilità anche ai fini di eventuali controlli futuri).

- Devono essere rispettati gli obblighi in materia di **informazione e pubblicità**: garantire visibilità e diffusione agli interventi finanziati, riportando in tutte le attività di comunicazione/disseminazione i loghi UE, PNRR, MUR e l'indicazione di progetto «finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU» anche in accordo con la funzione **Coordinamento FS-MOST** e la funzione **Research & Science Advisor**. Su ogni documento, oltre al logo della società, devono essere presenti i seguenti tre loghi:



- Deve essere tracciata adeguatamente l'**IVA** con evidenza analitica attraverso un sistema di contabilità separata.
- Nei casi in cui l'**IVA** costituisca un costo **non recuperabile**, può essere rendicontata: il Legale Rappresentante del soggetto deve allegare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.445/2000 attestante la non recuperabilità dell'IVA, che deve essere riportata sulla piattaforma in una sezione ad hoc.
- La spesa deve essere cofinanziata in base all'attività per il 50%** di Ricerca Industriale, Studi di Fattibilità e Investimenti in Infrastrutture.
- Le spese rendicontate **non devono essere finanziate da altre fonti del bilancio dell'Unione Europea o da altri fondi pubblici, inclusi i meccanismi di natura fiscale** quali il credito di imposta, e devono rispettare il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione Europea in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e ss.mm.ii.
- Ciascun Affiliato può proporre **variazioni alle attività progettuali** di sua competenza rispetto a quelle riportate nell'Allegato A del Decreto di Concessione del Finanziamento, solo previa autorizzazione scritta dell'HUB, che si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del Progetto non autorizzate.
- Per il **raggiungimento degli obiettivi del Programma** l'HUB può apportare qualsiasi modifica alle attività progettuali di competenza dell'Affiliato che ritenga necessaria.
- Almeno il 40% delle risorse finanziarie deve essere destinato ad attività realizzate nelle regioni del Mezzogiorno** (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
- Ciascun soggetto affiliato agli Spoke deve **dedicare al Programma di ricerca non meno di 7 ricercatori, di cui almeno 4 per 3 mesi uomo/annui**.
- Per il **15% dei costi diretti** ammissibili del Personale non servono giustificativi, in quanto rientrano nell'importo complessivo delle spese del personale indicato dall'Affiliato nel budget di spesa.

- Il **Personale Amministrativo-Contabile non rientra nelle spese ammissibili**, ma è forfettariamente conteggiato nella categoria "Costi Indiretti" che, come sopra evidenziato, vale il 15% dei costi del Personale.
- **Rispetto per tutto il ciclo di vita del progetto delle prescrizioni in materia di DNSH**, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, ai sensi dell'Art. 17 del Reg (UE) 2020/852 e nell'Allegato alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021, n. 32 *“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”*, incluse quelle riguardanti il Regime associato alla misura a cui fa riferimento il progetto, le schede tecniche associate alla misura, le relative checklist e atti connessi.
- **Assicurare che il progetto non arrechi danno significativo a nessuno dei sei obiettivi ambientali** indicati all'art. 17 del Reg (UE) 2020/852, e in particolare:
  - alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
  - all'adattamento ai cambiamenti climatici;
  - all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine;
  - all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti;
  - alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento nell'acqua o nel suolo;
  - alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
- **A non svolgere all'interno del progetto le seguenti attività di ricerca cosiddetta «brown»** in conformità alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH”*:
  - attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
  - attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
  - attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
  - attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.
- **Rispetto delle indicazioni previste dalla legislazione nazionale applicabile**, ivi comprese quelle disposte dal Codice dell'ambiente di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.
- Assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi del **tagging digitale, climatico, della parità di genere (Gender Equality)** per la protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.
- **Adottare proprie procedure interne**, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e alla normativa nazionale, nonché a quanto indicato dal MUR per l'attuazione degli interventi del PNRR.

- Garantire il rispetto alla disciplina comunitaria e nazionale in caso di ricorso diretto a **esperti esterni**.
- Osservare le **disposizioni** della normativa vigente nell'ambito dell'affidamento degli appalti.

## **1.2 Spese del personale dipendente**

Per le **spese del personale dipendente** coinvolto nel progetto è prevista la rendicontazione del personale inserito nella Massa Critica (totalità del personale della società affiliata per il programma di ricerca di uno specifico Spoke) a costi standard, in base ai valori indicati dal MUR nelle linee guida (pag. 26, tabella n. 1 “Costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca e sviluppo”) riferiti ai livelli di qualifica del dipendente (dirigente, quadro, impiegato), moltiplicati per le ore mensili svolte nell'attività di ricerca, complessivamente con base annua prevista dal CCNL.

Di seguito la documentazione da predisporre per la rendicontazione dei costi del personale:

- Lettera di incarico/Ordine di Servizio -ODS (Allegato 2.3)
- Curriculum vitae
- Comunicazione dati del personale (nome, cognome, codice fiscale)
- Timesheet (Allegato 2.4)
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) “Attestazione ore svolte nel periodo” (Allegato 2.5)
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) “Autocontrollo-Attestazione verifiche svolte” (Allegato 2.6).

La **lettera di incarico/ODS** deve essere controfirmata dal dipendente, deve essere emessa con un data anteriore all'inizio dell'attività da parte della persona designata per il periodo di svolgimento non superiore al 31/08/2025 (salvo proroghe), deve richiamare il progetto e il programma finanziato, deve indicare la categoria e qualifica del dipendente (Dirigente, Quadro, Impiegato), l'attività da svolgere e il luogo di svolgimento. Con una specifica DSAN (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio) può essere richiesto il riconoscimento di attività svolte dal dipendente in data anteriore a quella della lettera di incarico (Allegato 2.7).

Il **curriculum vitae** del dipendente deve essere redatto in formato europeo in lingua inglese, datato, firmato e recante l'assenso al trattamento dei dati personali (es: *according to law 679/2016 of the Regulation of the European Parliament of 27th April 2016, I hereby express my consent to process and use my data provided in this CV*).

La **Comunicazione dati del personale** (nome, cognome, codice fiscale) da predisporre per ciascun Spoke per il caricamento dei dati del personale sulla piattaforma di rendicontazione “At Work”.

Non è possibile avviare la rendicontazione prima del caricamento dei dati relativi alla massa critica sulla piattaforma “At Work” e in assenza delle lettere d'incarico/ODS e Curriculum vitae.

Il **Timesheet** deve essere redatto per ogni risorsa del personale per l'attività mensile svolta in uno o più

Spoke, con distinzione delle ore dedicate al progetto per attività di ricerca industriale e per studi di fattibilità. Le ore da indicare devono essere espresse in “ore:minuti”. Il file riporta il nome, il cognome, il codice fiscale del dipendente, le ore totali rendicontate per il mese di riferimento e l’indicazione di eventuali attività svolte su altri progetti rispetto a quelli del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (MOST). Deve essere datato e firmato dal dipendente e dal responsabile della società ed inviato in formato pdf, salvo diversa indicazione da parte della funzione **Coordinamento FS-MOST**.

La **DSAN - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio “Attestazione ore svolte nel periodo”**, deve essere firmata dal Legale Rappresentante, riportare il livello del dipendente da CCNL, il numero massimo di ore da CCNL, il numero complessivo di ore svolte dal dipendente e riportate nel rendiconto del mese di riferimento (timesheet) e inserita in “At Work”.

La **DSAN - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio “Autocontrollo-Attestazione verifiche svolte”**, deve essere firmata dal Legale Rappresentante e redatta per ogni rendicontazione al fine di attestare la regolarità amministrativo-contabile, ex-ante sul titolare effettivo, ex ante sull’assenza di conflitto di interessi, l’assenza del doppio finanziamento, rispetto delle condizionalità e dei requisiti connessi alla misura del PNRR cui è associato il progetto, rispetto dei principi trasversali e della conformità delle attività svolte. La dichiarazione deve essere inviata al **Referente FS di Spoke**, per il successivo inoltro allo Spoke Leader/HUB via e-mail.

Per entrambe le DSAN, nel caso in cui non siano firmate dal Legale Rappresentante ma da un suo delegato, occorre indicare nelle suddette gli estremi della Procura del firmatario (numero repertorio, nome del notaio, data di stipulazione dell’atto).

### ***1.3 Spese di consulenza specialistica***

Per le **spese di consulenza specialistica**, commissionate a terzi, persone fisiche o soggetti giuridici, prestatori d’opera è prevista la documentazione sotto riportata distinta per le spese di consulenza da persone fisiche e da società. Le “Linee guida” precisano che non sono ammesse spese per contratti a forfait comprensivi di diarie, rimborsi spese per viaggi e missioni, benefits.

#### **Documentazione per spese di consulenza da persone fisiche:**

- Procedura di selezione del prestatore
- Curriculum vitae
- Contratto relativo alla prestazione richiesta
- Check list di cui all’Allegato 6 delle linee Guida per selezione personale a valere sul PNRR, esterno alla società
- Fattura o ricevuta/nota debito
- Documentazione per dimostrare l’avvenuto pagamento
- Documentazione per regolarità della posizione fiscale e contributiva
- Relazione delle attività svolte dal professionista nel periodo in cui si riferisce il pagamento
- Attestazione di regolare esecuzione delle attività del responsabile scientifico o del dirigente
- Eventuali output prodotti dal prestatore d’opera con riferimento al progetto.

- Documentazione attestante l'autorizzazione all'incarico (per dipendenti pubblici, se prevista)
- Delibera del Consiglio di Amministrazione (CdA) se la prestazione è svolta da un membro del CdA.

Documentazione per spese di consulenza da società:

- Procedura di selezione del prestatore
- Contratto relativo alla prestazione richiesta
- Check list di cui all'Allegato 7 delle linee Guida per soggetti sottoposti / non sottoposti al codice degli appalti vigente
- Fattura di acquisto
- Documentazione per dimostrare l'avvenuto pagamento
- Relazione bimestrale delle attività svolte nel periodo in cui si riferisce il pagamento
- Attestazione di regolare esecuzione delle attività
- Eventuali output prodotti dal prestatore d'opera con riferimento al progetto.

Di seguito alcuni requisiti da considerare nella predisposizione della suddetta documentazione.

La **procedura di selezione del prestatore** prevede la trasmissione da parte delle società affiliate degli atti amministrativi emanati per individuare il prestatore d'opera, compresa la documentazione dalla quale risulti l'impossibilità di utilizzare personale interno avente le competenze e la disponibilità necessarie per svolgere l'attività del progetto. A titolo esemplificativo, non esaustivo, è prevista la documentazione della procedura di evidenza pubblica, ricerca di mercato, determina di istituzione della commissione di valutazione, verbali di valutazione della Commissione, atti di approvazione delle graduatorie, comunicazioni ai candidati vincitori, attestazione della pubblicità del bando delle graduatorie, attestazione della verifica dei requisiti.

Il **Contratto relativo alla prestazione richiesta** deve riportare il riferimento al progetto finanziato, il CUP, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, il periodo di svolgimento, l'importo previsto e le modalità di corresponsione dello stesso.

La **Check list di cui all'Allegato 6 delle linee Guida** deve essere compilata nel caso di selezione di personale esterno alla società per consulenti persone fisiche, che verrà dedicato alle attività del MOST e deve essere firmata dal titolare della procedura.

La **Check list di cui all'Allegato 7 delle linee Guida** deve essere compilata nelle sezioni A-B-C-D-F per soggetti beneficiari sottoposti al codice degli appalti vigente.

La **Fattura o ricevuta/nota debito** deve essere emessa per i consulenti persone fisiche, mentre per le società è richiesta la **fattura di acquisto**; in entrambi i casi devono essere riportati la data, il periodo di riferimento, i dati del progetto, il CUP e GIG eventuale, l'attività svolta e l'output prodotto.

La **Documentazione per dimostrare l'avvenuto pagamento** consiste nel mandato di pagamento quietanzato o nella disposizione di pagamento a favore del prestatore d'opera con relativo estratto conto.



La **Documentazione per regolarità della posizione fiscale e contributiva** prevista si compone di DURF, DURC, modelli F24 per attestare la correttezza dei versamenti in ottemperanza alla normativa fiscale e contributiva. In caso di pagamenti cumulativi, dovrà essere fornita una DSAN contenente un prospetto riepilogativo della formazione di tali pagamenti/oneri, evidenziando la quota di competenza relativa al prestatore rendicontato per ciascuno dei modelli F24 presentati.

#### ***1.4 Spese di acquisto materiali, strumenti, attrezzature***

Per le **spese di acquisto materiali, strumenti, attrezzature** è necessaria la seguente documentazione:

- Procedura di selezione del fornitore
- Contratto/Ordine di acquisto
- DDT - buono di consegna (se previsto)
- Documento di conformità all'ordine e verbale di collaudo
- Dichiarazione tecnica che spiega l'esclusività dell'acquisto di un bene al progetto
- Check list di cui all'Allegato 7 delle linee Guida per soggetti sottoposti /non sottoposti al codice degli appalti vigente.
- Fattura di acquisto
- Documentazione per dimostrare l'avvenuto pagamento
- Registro dei beni ammortizzabili
- Prospetto di calcolo della quota d'uso del bene per il progetto per le seguenti situazioni:
  - il bene acquistato non è funzionale in via esclusiva al conseguimento degli obiettivi del progetto finanziato ma connesso a ulteriori finalità;
  - il bene è già nella disponibilità dei beneficiari precedentemente all'ammissione a finanziamento, non rinvenendosi l'esclusività funzionale al conseguimento degli obiettivi realizzativi del Programma di ricerca finanziato, bensì ritenuti connessi anche a ulteriori finalità.
- Dimostrazione della convenienza economica del leasing rispetto all'acquisto (in caso di leasing).

Per quanto attiene alla **Procedura di selezione del fornitore**, è necessaria la trasmissione da parte delle società controllate a FS SpA dei documenti relativi alla ricerca di mercato per individuare i fornitori, dell'elenco dei fornitori qualificati, del Regolamento interno preesistente, in conformità con le regole interne del beneficiario e congruente con il codice appalti.

Il **Contratto/Ordine** deve riportare il riferimento al progetto, il numero CUP, in caso di gara il numero CIG, in dettaglio quantità, costi unitari e costo totale.

Il **DDT e il Buono di Consegna**, se previsti dalla normativa, devono riportare i dati indicati nel contratto/ordine e devono essere inviati a FS SpA per documentare la consegna eseguita.

Il **Documento di conformità all'ordine e verbale di collaudo** deve essere inviato a FS SpA per attestare che quanto ordinato è stato consegnato come richiesto e conforme ai requisiti di acquisto.

La **Check list di cui all'Allegato 7 delle linee Guida** è redatta per la verifica delle procedure di appalto e deve essere sottoscritta dal titolare della procedura, con sezioni applicabili A-B-C-D-F per soggetti



sottoposti al Codice Appalti.

La **Fattura di acquisto** del fornitore deve includere il riferimento all'ordine/contratto, con espresso e univoco riferimento al progetto (CUP) e, in caso di gare il CIG, indicazione delle quantità con dettaglio dei costi unitari e costo totale, degli importi imponibile e dell'IVA.

La **Documentazione per dimostrare l'avvenuto pagamento** occorre quale mandato di pagamento quietanzato, disposizione di pagamento con CRO e deve essere accompagnata dal relativo estratto conto, documentazione comprovante il pagamento dell'IVA nel caso in cui l'IVA sia indeducibile.

Il **Registro beni ammortizzabili** va trasmesso per il bene utilizzato nel progetto con evidenza della descrizione e delle relative quote di ammortamento annuali.

Il **Prospetto di calcolo della quota d'uso del bene** per il progetto in argomento deve riportare la descrizione del bene, il numero identificativo del bene sul libro cespiti, l'importo del bene, la percentuale di ammortamento, il tempo e la percentuale di utilizzo nel progetto, nonché la somma imputata al finanziamento pubblico; qualora il bene sia utilizzato in più progetti finanziati con fondi pubblici, dovranno essere indicate separatamente le quote di utilizzo sino al completamento massimo del 100%. In base al Reg (UE) 2021/1060 e dal DPR 5 febbraio 2018 n. 22 le spese di ammortamento sono ammissibili limitatamente al periodo di operatività del progetto e alla quota d'uso del bene nel progetto, qualora siano soddisfatte le condizioni sotto riportate:

- l'importo della spesa deriva da documenti giustificativi con valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili;
- i costi devono riferirsi esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
- i beni ammortizzati sono stati acquistati senza sovvenzioni pubbliche.

Per il calcolo del costo ammissibile si tiene conto della seguente formula:

$$C = [(F \times P \times Q) / 360] \times T$$

Con

**C**= costo ammissibile

**F**= costo di acquisto (ricavato dalla fattura) dell'immobilizzazione materiale o immateriale

**P**= giornate di utilizzo dell'attrezzatura o della strumentazione per il progetto di ricerca (con valore massimo uguale alla differenza in giorni tra la data di fine progetto e la data di consegna dell'attrezzatura)

**Q**= coefficiente di ammortamento civilistico e fiscale indicato nel registro dei beni Ammortizzabili

**T**= percentuale di utilizzo effettivo dell'attrezzatura o della strumentazione nell'ambito del Progetto (rispetto agli eventuali altri progetti).

La **Dimostrazione della convenienza economica del leasing rispetto all'acquisto** (in caso di leasing) si estrinseca nel prospetto di calcolo della quota d'uso del bene per il progetto in argomento; qualora il bene sia utilizzato in più progetti finanziati con fondi pubblici, dovranno essere indicate separatamente

le quote di utilizzo sino a complemento massimo del 100%.

Per i **materiali** deve essere predisposto: l'elenco riepilogativo dei materiali effettivamente utilizzati con quantità, voce merceologica, costi unitari e complessivi, firmato dal Responsabile Scientifico; il Verbale di distruzione degli scarti di lavorazione, se esistenti, con "Ricevuta di discarica"; le Bolle di prelievo dal magazzino con riferimento al progetto, firmate per consegna e ricevuta dal Responsabile Scientifico e il Registro di carico e scarico.

Per gli **strumenti e le attrezzature** occorre una Dichiarazione da parte del soggetto responsabile della procedura e ogni utile documentazione idonea a dimostrare che l'acquisto si è reso necessario per la realizzazione del progetto finanziato, nonché che vi sia un utilizzo esclusivo per le finalità progettuali in presenza di acquisto di attrezzature e strumentazioni esclusivamente funzionali al conseguimento degli obiettivi realizzativi del progetto finanziato, il cui costo è rendicontabile al 100%.

Per i **beni già acquistati** dalle società controllate in data antecedente all'inizio del progetto di ricerca finanziato, iscritti nel Registro beni ammortizzabili, è necessaria la seguente documentazione, già descritta in precedenza, esclusa la DSAN (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio) per attestare che il bene utilizzato nel progetto di ricerca non è stato acquistato, ma si trova già nella disponibilità della società:

- Registro dei beni ammortizzabili
- Prospetto di calcolo della quota d'uso del bene per il progetto
- Check list di cui all'Allegato 7 delle linee Guida per la verifica delle procedure di appalto
- DSAN (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio) firmata dal soggetto Responsabile della procedura, per attestare che il bene utilizzato nel progetto di ricerca non è stato acquistato, ma si trova già nella disponibilità della società, ed è funzionale al conseguimento degli obiettivi realizzativi del progetto finanziato.

### ***1.5 Altre tipologie di spese***

Possono essere rendicontate **altre tipologie di spese** connesse strettamente all'esecuzione del Programma di ricerca proposte e accettate dal MUR, nel rispetto della normativa, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. L'importo di dette spese rientra nell'ammontare complessivo del budget dell'Affiliato, di cui all'Allegato B - Piano dei Costi e delle Agevolazioni del Decreto Direttoriale n.1033 del 17/06/2022. La documentazione da trasmettere varierà a seconda della tipologia di spesa e sarà da concordare con la funzione **Coordinamento FS-MOST**, a seguito degli accordi intercorsi con lo Spoke Leader, richiamando quanto previsto nelle voci descritte in precedenza. A titolo esemplificativo trattasi di costi per lo svolgimento di attività di comunicazione e disseminazione riconducibili al Programma di ricerca con espresse finalità di divulgazione dei risultati, in particolare costi di missione e trasferta (comprese le eventuali quote di iscrizione) per partecipare o organizzare meeting, convegni, eventi e workshop, costi di pubblicazioni scientifiche, costi di missione e trasferta per attività di ricerca e sperimentazione strettamente correlate.

---

## ALLEGATO 2 – Modulistica

- 2.1. Scheda Progetto
- 2.2. Scheda avanzamento attività FS-MOST
- 2.3. Lettera d'incarico
- 2.4. Timesheet
- 2.5. DSAN Attestazione ore svolte
- 2.6. DSAN Autocontrollo attestazione verifiche svolte
- 2.7. DSAN firma successiva incarico

**ALLEGATO 2.1 Scheda Progetto**


| CN MOST - Proposta progettuale      |                                         |                                     |                  |                            |                                  |                                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Società</b>                      |                                         |                                     |                  |                            |                                  |                                        |
| <b>Spoke</b>                        | Denominazione                           | <b>Spoke X - XXXX</b>               |                  |                            |                                  |                                        |
|                                     | Leader                                  | <b>Università XXXX - Prof. XXXX</b> |                  |                            |                                  |                                        |
|                                     | Obiettivo                               |                                     |                  |                            |                                  |                                        |
| <b>Work Package</b>                 | Denominazione                           | <b>WP X - XXXX</b>                  |                  |                            |                                  |                                        |
|                                     | Leader                                  | <b>Università XXXX - Prof. XXXX</b> |                  |                            |                                  |                                        |
|                                     | Obiettivo                               |                                     |                  |                            |                                  |                                        |
| <b>Task</b>                         | Denominazione                           | <b>Task X.X -</b>                   |                  |                            |                                  |                                        |
|                                     | Leader                                  | <b>Università XXXX - Prof. XXXX</b> |                  |                            |                                  |                                        |
| <b>Proposta Progettuale</b>         | <b>Denominazione</b>                    |                                     |                  |                            |                                  |                                        |
|                                     | Società proponente                      |                                     |                  |                            |                                  |                                        |
|                                     | Direzione / SO responsabile e referente |                                     |                  |                            |                                  |                                        |
|                                     | Altre Direzioni / SO coinvolte          |                                     |                  |                            |                                  |                                        |
|                                     | Partner esterni                         |                                     |                  |                            |                                  |                                        |
|                                     | Descrizione del progetto                |                                     |                  |                            |                                  |                                        |
|                                     | Obiettivi e principali benefici         |                                     |                  |                            |                                  |                                        |
|                                     | Output                                  |                                     |                  |                            |                                  |                                        |
|                                     | Ulteriori informazioni                  | -                                   |                  |                            |                                  |                                        |
|                                     | <b>Rendicontazione</b>                  | Importo da rendicontare             | <i>Totale</i>    | <i>Ricerca<br/>striale</i> | <i>indu-Studi di fattibilità</i> | <i>Investimenti<br/>infrastruttura</i> |
| Numero ore per tipologia di risorsa |                                         | <i>Totale</i>                       | <i>Dirigente</i> | <i>Quadro</i>              | <i>Impiegato</i>                 |                                        |
| Risorse coinvolte                   |                                         |                                     |                  |                            |                                  |                                        |
|                                     |                                         |                                     |                  |                            |                                  |                                        |



**Proprietà intellettuale**

Eventuale Background / Sideground da condividere con altri membri del WP

Necessità di sottoscrivere l'Acceptance Declaration (in accordo linee Guida IP)

| GANTT | 2023 |     |     |     | 2024 |     |     |     | 2025 |     |     |     |
|-------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
|       | mar  | giu | set | dic | mar  | giu | set | dic | mar  | giu | set | dic |
|       |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|       |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|       |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|       |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|       |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |
|       |      |     |     |     |      |     |     |     |      |     |     |     |

Per la Società:  
(nome, cognome e firma)

Referente di Spoke:  
(nome, cognome e firma)

Data:



## ALLEGATO 2.2 Scheda Avanzamento Attività FS – MOST

|                                                                                                                                       | SCHEDA AVANZAMENTO ATTIVITA' "MOST" |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|
| SOCIETA':                                                                                                                                                                                                              |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| SPOKE:                                                                                                                                                                                                                 |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| MESE:                                                                                                                                                                                                                  |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE:                                                                                                                                                                                             | 1                                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Totale |
| Partecipazione a riunioni interne all'Azienda                                                                                                                                                                          |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| Partecipazione a riunioni organizzate dall'HUB                                                                                                                                                                         |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| Partecipazione a riunioni organizzate dallo SPOKE                                                                                                                                                                      |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| Partecipazione a riunioni organizzate da FS ITALIANE                                                                                                                                                                   |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| Partecipazione ad eventi organizzati da HUB/SPOKE                                                                                                                                                                      |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| Sviluppo di contributi tecnici per documenti/deliverables predisposti da Spoke/WP (v. nota 1)                                                                                                                          |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| Predisposizione di documenti/deliverables di responsabilità diretta (v. nota 1)                                                                                                                                        |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| Partecipazione a test in sito o in laboratorio (v. nota 2)                                                                                                                                                             |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| Sopralluoghi (V. nota 2)                                                                                                                                                                                               |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| Emissione ordine di acquisto                                                                                                                                                                                           |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| Pubblicazione bando di gara per forniture                                                                                                                                                                              |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| Stipula Contratto con fornitore                                                                                                                                                                                        |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| Totale                                                                                                                                                                                                                 |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| Descrizione attività svolte<br>(descrivere in forma sintetica, eventualmente aggiungendo altro non preimpostato nella tabella, l'avanzamento con riferimento a WP e task oggetto delle attività svolte indicate sopra) |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| Nota 1                                                                                                                                                                                                                 |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| Titoli deliverables:                                                                                                                                                                                                   |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| Nota 2                                                                                                                                                                                                                 |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| Luogo del/i sopralluogo/i e obiettivo/i:                                                                                                                                                                               |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| Redatto da:<br>(nome, cognome e firma del Responsabile delle attività)                                                                                                                                                 |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| Data emissione:                                                                                                                                                                                                        |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |

**ALLEGATO 2.3 Lettera d'incarico****CARTA INTESTATA SOCIETA'**

Egregio/a  
**Nome e Cognome risorsa**  
Cod. Fisc. n.... (num. Codice fiscale risorsa)  
c/o società

**Oggetto:** Lettera di incarico - PNRR MUR – Missione 4, Componente 2 – Investimento 1.4 - Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S su alcune Key Enabling Technologies - D.D. n. 3138 del 16 dicembre 2021, D.D. 3175 del 18 dicembre 2021 e D.D. 1033 del 17 giugno 2022 – Codice progetto CN\_00000023-Titolo progetto: “Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile” CUP: \_\_\_\_\_

Con la presente siamo lieti di comunicarLe che, nell'ambito del rapporto di lavoro intercorrente con la Scrivente Società, nella struttura \_\_\_\_\_, con qualifica di \_\_\_\_\_ (riportare dirigente, quadro, impiegato) inquadramento nel livello professionale \_\_\_\_\_, figura professionale \_\_\_\_\_ posizione retributiva \_\_\_\_\_, del CCNL Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 22.03.2022, Lei è stato/a individuato/a per partecipare alla realizzazione del Progetto di cui all'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S su alcune Key Enabling Technologies - D.D. n. 3138 del 16 dicembre 2021 e D.D. 3175 del 18 dicembre 2021 – Progetto “Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile”, codice CN\_00000023– CUP \_\_\_\_\_, finanziato nell'ambito del Programma PNRR MUR – “Missione 4, Componente 2, Investimento 1.4”.

Nel citato Progetto, Lei svolgerà le seguenti attività, riconducibili alle mansioni da Lei abitualmente espletate nell'ordinario rapporto di lavoro e coerenti con il Suo attuale inquadramento professionale \_\_\_\_\_ (indicare le attività che saranno svolte dalla risorsa per la realizzazione del progetto (es. partecipazione a riunioni, etc) nell'ambito \_\_\_\_\_ (indicare lo/gli Spoke a cui parteciperà la risorsa).

Tali attività saranno svolte nel rispetto del Suo normale orario di lavoro e presso la sede di lavoro formalmente assegnata, \_\_\_\_\_ (indicare l'indirizzo della sede), mediante l'utilizzo delle risorse digitali messe a disposizione dalla Società di appartenenza, per il numero di ore previsto dal Progetto medesimo pari a \_\_\_\_\_ (indicare il numero di ore previste dal progetto per la risorsa) e nel periodo che va dal \_\_\_\_\_ (data non inferiore a quella della lettera di incarico) al 31/08/2025, salvo proroghe del progetto.

Nessun specifico compenso è dovuto, ad alcun titolo, per le attività da Lei svolte in esecuzione del presente incarico.

Resta inteso che le modalità di svolgimento dell'attività dovranno essere preventivamente concordate con il Suo diretto Responsabile, per armonizzarle con la restante parte della sua attività lavorativa.

Lei dichiara di essere a conoscenza che i dati contenuti nel presente modulo saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (c.d. GDPR), del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 (c.d. Nuovo Codice Privacy) e del Framework di Data Protection di Gruppo. Per maggiori dettagli si rinvia all'Informativa resa ai dipendenti sulla protezione dei dati personali.

Nell'augurarLe buon lavoro e ringraziandoLa anticipatamente per l'attività che svolgerà a favore del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile, La preghiamo di restituire copia della presente sottoscritta per accettazione.

Distinti saluti

Luogo, data

**(Società datrice di lavoro)**

**La risorsa per ricevuta e accettazione**

**Il Responsabile**

**Nome Cognome**

**Nome Cognome**

**ALLEGATO 2.4 Timesheet**

|                                                                                                        |                                                           |                                                                                   |                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                          |                         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|
|                       | <b>Finanziato dall'Unione europea</b><br>NextGenerationEU |  | <b>Ministero dell'Università e della Ricerca</b> |  | <b>Italiadomani</b><br>Cultura, Istruzione, Ricerca, Lavoro e Previdenza |  | <b>FERROVIE ITALIANE</b> | <b>LOGO CONTROLLATA</b> |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| TIMESHEET PER RENDICONTAZIONE PERSONALE                                                                |                                                           |                                                                                   |                                                  |                                                                                   |                                                                          | Mese:                                                                             | XXXX                     | Anno:                   | XXXX |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| Titolo del progetto: Sustainable Mobility Center (Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile – CNMS) |                                                           |                                                                                   |                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                          |                         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| CUP progetto: XXXXXX                                                                                   |                                                           |                                                                                   |                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                          |                         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| Codice del progetto: CN_00000023                                                                       |                                                           |                                                                                   |                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                          |                         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| Denominazione soggetto: Ferrovie dello Stato Italiane (Nome società controllata)                       |                                                           |                                                                                   |                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                          |                         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| <b>Figura professionale</b>                                                                            |                                                           |                                                                                   |                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                          |                         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| Nome: XXXXX                                                                                            |                                                           |                                                                                   |                                                  |                                                                                   |                                                                          | Cognome: XXXXX                                                                    |                          |                         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| Codice fiscale: XXXXX                                                                                  |                                                           |                                                                                   |                                                  |                                                                                   |                                                                          | Ore totali rendicontate sul progetto per il mese in oggetto: 0:00                 |                          |                         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| DAY                                                                                                    | 1                                                         | 2                                                                                 | 3                                                | 4                                                                                 | 5                                                                        | 6                                                                                 | 7                        | 8                       | 9    | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Totale |
| <b>Riferimento</b>                                                                                     |                                                           |                                                                                   |                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                          |                         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| <b>SPOKE N° xx</b>                                                                                     |                                                           |                                                                                   |                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                          |                         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0:00   |
| Attività di RICERCA INDUSTRIALE svolta sul progetto                                                    |                                                           |                                                                                   |                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                          |                         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0:00   |
| Attività di STUDI FATTIBILITA' svolta sul progetto                                                     |                                                           |                                                                                   |                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                          |                         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0:00   |
|                                                                                                        |                                                           |                                                                                   |                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                          |                         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0:00   |
| <b>SPOKE N° xx</b>                                                                                     |                                                           |                                                                                   |                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                          |                         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0:00   |
| Attività di RICERCA INDUSTRIALE svolta sul progetto                                                    |                                                           |                                                                                   |                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                          |                         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0:00   |
| Attività di STUDI FATTIBILITA' svolta sul progetto                                                     |                                                           |                                                                                   |                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                          |                         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0:00   |
|                                                                                                        |                                                           |                                                                                   |                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                          |                         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0:00   |
| <b>Attività svolta su altri progetti MUR:</b>                                                          |                                                           |                                                                                   |                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                          |                         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| CUP XXXXXXXXXXXXXXXX                                                                                   |                                                           |                                                                                   |                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                          |                         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0:00   |
| CUP XXXXXXXXXXXXXXXX                                                                                   |                                                           |                                                                                   |                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                          |                         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0:00   |
| Attività svolte su altri progetti                                                                      |                                                           |                                                                                   |                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                          |                         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0:00   |
| Attività ordinaria                                                                                     |                                                           |                                                                                   |                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                          |                         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0:00   |
| Altro (malattie, ferie...)                                                                             |                                                           |                                                                                   |                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                          |                         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0:00   |
| <b>Totale ore</b>                                                                                      |                                                           |                                                                                   |                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                          |                         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0:00   |
| Firma del Dipendente ( nome e cognome ):                                                               |                                                           |                                                                                   |                                                  |                                                                                   |                                                                          | Firma del Responsabile ( nome e cognome ):                                        |                          |                         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| Data:                                                                                                  |                                                           |                                                                                   |                                                  |                                                                                   |                                                                          | Data:                                                                             |                          |                         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
| Firma:                                                                                                 |                                                           |                                                                                   |                                                  |                                                                                   |                                                                          | Firma:                                                                            |                          |                         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |



## ALLEGATO 2.5 DSAN Attestazione ore svolte

## CARTA INTESATA SOCIETA'

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.4 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - Programma di ricerca CN00000023 "Sustainable Mobility Center (Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile – CNMS)" finanziato dal Decreto Direttoriale di concessione del finanziamento n.1033 del 17.06.2022 a valere sulle risorse del PNRR MUR – M4C2 – Investimento 1.4 - Avviso "Centri Nazionali" - D.D. n. 3138 del 16 dicembre 2021

Il sottoscritto, ....., nato a ....., il ....., in qualità di legale rappresentante ....., beneficiario di agevolazione a valere su avviso MUR pubblicato con Decreto direttoriale n. 3175/2021, PNRR Missione 4, Componente 2, Investimento 1.4 - Codice progetto MUR: CN00000023 – CUP....., Titolo Progetto "Sustainable Mobility Center (Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile – CNMS)", consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

## DICHARA

Che le seguenti unità di personale sono state impegnate e rendicontate nelle attività progettuali relative al progetto in oggetto per i mesi di ..... come specificato nella seguente tabella:

| Nome e Cognome | Livello CCNL | N. max ore CCNL | Numero ore rendicontate |
|----------------|--------------|-----------------|-------------------------|
|                |              |                 |                         |
|                |              |                 |                         |
|                |              |                 |                         |
|                |              |                 |                         |
|                |              |                 |                         |

Dichiara altresì che per tutte le risorse sopra elencate le ore indicate nel periodo di riferimento non sono state oggetto di rendicontazione a valere su altre progettualità, sia finanziate dal Ministero dell'Università e della Ricerca sia da altre fonti.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante  
(firma digitale)

## ALLEGATO 2.6 DSAN Autocontrollo attestazione verifiche svolte

## CARTA INTESTATA SOCIETA'

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.4 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - Programma di ricerca CN00000023 "Sustainable Mobility Center (Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile – CNMS)" finanziato dal Decreto Direttoriale di concessione del finanziamento n. 1033 del 17.06.2022 a valere sulle risorse del PNRR MUR – M4C2 – Investimento 1.4 - Avviso "Centri Nazionali" - D.D. n. 3138 del 16 dicembre 2021

**Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR**

*(Dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. 445 del 2000)*

La/Il sottoscritta/o \_\_\_\_\_ nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, Legale Rappresentante dello Spoke/ Soggetto affiliato allo Spoke \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, Partita IVA \_\_\_\_\_, avente sede Legale a \_\_\_\_\_ in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

**DICHIARA**

relativamente al Programma di ricerca CN00000023 "Sustainable Mobility Center (Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile – CNMS)", CUP....., con particolare riferimento alle spese esposte/costi maturati nei Rendiconti di Progetto, ivi comprese le eventuali relative procedure di selezione, per il periodo da XX/XX/XXXX a XX/XX/XXXX, di rispettare:

- il principio di regolarità amministrativo-contabile delle spese esposte a rendicontazione;
- il principio dell'assenza del doppio finanziamento previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;
- la normativa antiriciclaggio ("titolare effettivo") e garantire l'adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode e conflitto di interessi;
- le condizionalità, i principi trasversali, la pertinente normativa ambientale comunitaria e nazionale e tutti gli ulteriori requisiti connessi alla misura del PNRR a cui è associato il progetto.

Dichiara, infine, di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali fornita nella sezione "Privacy" <https://www.centronazionalemost.it/privacy.html> del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile, rilasciata ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante  
(Firma digitale)

## ALLEGATO 2.7 DSAN firma successiva incarico

## CARTA INTESTATA SOCIETA'

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 COMPONENTE 2  
INVESTIMENTO 1.4 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU  
- Programma di ricerca CN00000023 “Sustainable Mobility Center (Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile – CNMS)” finanziato dal Decreto Direttoriale di concessione del finanziamento n.1033 del 17.06.2022 a valere sulle risorse del PNRR MUR – M4C2 – Investimento 1.4 - Avviso “Centri Nazionali”  
- D.D. n. 3138 del 16 dicembre 2021

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C. F. \_\_\_\_\_, Legale  
Rappresentante di \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, Partita IVA \_\_\_\_\_, avente  
sede Legale a \_\_\_\_\_ in Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ PEC  
\_\_\_\_\_, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiara-  
zione o comunque non corrispondente al vero (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000), ai sensi del  
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss. mm. ii.

## DICHARA CHE

nelle more di quanto riportato nelle Linee Guida di rendicontazione Progetti PNRR - M4C2, che per il  
periodo XX/XX/XXXX – XX/XX/XXXX ai fini della rendicontazione delle Spese di Personale, per  
tutti i componenti della Massa Critica impegnati nelle attività di progetto per conto di [inserire denomi-  
nazione azienda], le lettere di incarico sono state firmate dal [Legale Rappresentante/Persona incaricata],  
in data XX/XX/XXXX in quanto [indicare motivazioni], non ne hanno consentito la firma in data  
anteriore.

Si precisa che il personale incaricato era consapevole di far parte della Massa Critica di Progetto ed aveva  
dato avvio alle relative attività a far data dal XX/XX/XXXX.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante



## ALLEGATO: VERSIONING DEL DOCUMENTO

| VERSIONE/DATA      | DOCUMENTO                                                                                                            | MOTIVO DELLA REVISIONE |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.0 del 19/03/2024 | <i>GR_LG_P_Linee d'indirizzo per lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti nell'ambito del MOST_n.63_v0.1</i> | Prima emissione        |
